

INSTINCT by MACO

LISTA KONTROLNA ODBIORU

Dane dotyczące zamówienia

Producent drzwi: _____

Numer zamówienia: _____

Klient: _____

Data zamówienia: _____

Data produkcji: _____

Wbudowane komponenty elektroniczne

Zasilacz i UPS

5 0 9 4 0 0 Zasilacz podtynkowy 230V/50Hz

Numer seryjny: _____ - _____




5 0 9 4 0 1 Zasilacz szynowy Top-hat 230V/50Hz

Numer seryjny: _____ - _____



5 0 9 4 1 0 Moduł UPS

Numer seryjny: _____ - _____

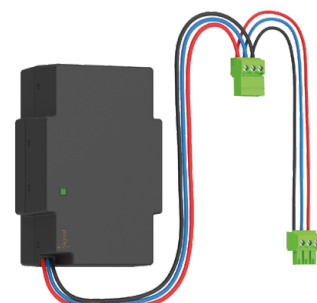

INSTINCT by MACO

LISTA KONTROLNA ODBIORU

Gateway

5 0 9 3 0 0 Gateway

Numer seryjny: 121749 - _____



5 0 9 3 0 1 Gateway z modułem akustycznym

Numer seryjny: 121749 - _____



Kontrola dostępu i akcesoria

5 0 9 3 1 0 Interfejs INSTINCT

Numer seryjny: 120368 - _____



5 0 9 3 2 0 Moduł Bluetooth INSTINCT

Numer seryjny: 120370 - _____



INSTINCT by MACO

LISTA KONTROLNA ODBIORU

System ryglowania

5 **0** **1** **1** INSTINCT Guard

| | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Moduł 1: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 2: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 3: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 4: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 5: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 6: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 7: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 8: | Numer seryjny: _____ - _____ |



5 **0** **1** **2** INSTINCT Guard+

| | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Moduł 1: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 2: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 3: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 4: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 5: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 6: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 7: | Numer seryjny: _____ - _____ |
| <input type="checkbox"/> | Moduł 8: | Numer seryjny: _____ - _____ |



INSTINCT by MACO

LISTA KONTROLNA ODBIORU

Kontrola poprawności funkcjonowania przed dostawą

| Funkcja | | Sprawdzono Działa | Sprawdzono nie działa | Sprawdzenie nie jest możliwe | Funkcja nie jest przewidziana |
|---------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Brak widocznych uszkodzeń modułów i zaczepów | | | | |
| 2 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą ręcznej obsługi haków ryglujących* | | | | |
| 3 | Prawidłowa regulacja elementów ryglujących* | | | | |
| 4 | Prawidłowe ryglowanie przy zamykaniu drzwi* | | | | |
| 5 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą zestawu testowego INSTINCT* | | | | |
| 6 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą aplikacji INSTINCT w trybie placu budowy | | | | |
| 7 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą czytnika linii papilarnych, klawiatury lub podobnych | | | | |
| 8 | Prawidłowe odryglowanie poprzez zamierzone sterowanie od wewnątrz | | | | |
| 9 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą systemu Smart Home | | | | |
| 10 | Prawidłowe działanie sygnalizacji akustycznej* | | | | |
| 11 | Prawidłowe działanie zmotoryzowanej funkcji dzień/noc* | | | | |
| 12 | Prawidłowe działanie monitoringu migawki elektronicznej | | | | |
| 13 | Prawidłowe działanie w połączeniu z napędem do drzwi dwuskrzydłowych | | | | |

*Szczegóły dotyczące przeprowadzania tych etapów testu znajdują się w instrukcji montażu.

Dodatkowe uwagi:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| Status dostawy | Akcesoria (karta administratora, gateway, zasilacz i moduł) | Dołączona dokumentacja (instrukcja obsługi i konserwacji, instrukcja użytkowania, dokumentacja modułów ryglujących) |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> W trybie dziennym (zalecane przez MACO) | <input type="checkbox"/> Odpowiednio zapakowane i zamknięte | <input type="checkbox"/> Odpowiednio zapakowane i zamknięte |
| <input type="checkbox"/> Zaryglowany | <input type="checkbox"/> Zostaną wysłane oddzielnie | <input type="checkbox"/> Zostaną wysłane oddzielnie |
| <input type="checkbox"/> Ościeżnica i skrzydło drzwiowe osobno (dopuszczalne tylko w trybie dziennym) | | |

Niniejszym instalator potwierdza prawidłowe wykonanie i prawidłowe funkcjonowanie drzwi przed ich dostarczeniem:

Miejsce i data

Podpis instalatora

INSTINCT by MACO

LISTA KONTROLNA ODBIORU

Protokół przekazania

| Funkcja | | Sprawdzono Działa | Sprawdzono nie działa | Sprawdzenie nie jest możliwe | Funkcja nie jest przewidziana |
|---------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Brak widocznych uszkodzeń modułów i zaczepów | | | | |
| 2 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą ręcznej obsługi haków ryglujących* | | | | |
| 3 | Prawidłowa regulacja elementów ryglujących* | | | | |
| 4 | Prawidłowe ryglowanie przy zamykaniu drzwi* | | | | |
| 5 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą zestawu testowego INSTINCT* | | | | |
| 6 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą aplikacji INSTINCT w trybie placu budowy | | | | |
| 7 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą czytnika linii papilarnych, klawiatury lub podobnych | | | | |
| 8 | Prawidłowe odryglowanie poprzez zamierzone sterowanie od wewnątrz | | | | |
| 9 | Prawidłowe odryglowanie za pomocą systemu Smart Home | | | | |
| 10 | Prawidłowe działanie sygnalizacji akustycznej* | | | | |
| 11 | Prawidłowe działanie zmotoryzowanej funkcji dzień/noc* | | | | |
| 12 | Prawidłowe działanie monitoringu migawki elektronicznej | | | | |
| 13 | Prawidłowe działanie w połączeniu z napędem do drzwi dwuskrzydłowych | | | | |

*Szczegóły dotyczące przeprowadzania tych etapów testu znajdują się w instrukcji montażu.

Dodatkowe uwagi:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Karta administratora

- przekazano
- nie przekazano
- Brak modułu Bluetooth w zestawie

Dokumentacja towarzysząca

(Instrukcja obsługi i konserwacji, instrukcja użytkowania, dokumentacja modułów ryglujących)

- przekazano
- nie przekazano

Niniejszym instalator potwierdza prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie drzwi przed ich dostarczeniem:

Miejsce i data

Podpis instalatora

Podpis klienta
